

FORMATO PARA EL REPORTE DE BENEFICIOS CUANTIFICABLES DEL CONTROL FISCAL

NOMBRE SUJETO DE CONTROL Alcaldía Municipal de la Gloria -Cesar

CLASIFICACION Y CUANTIFICACION DE BENEFICIOS

DIRECTOS

VALOR AHORRO

VALOR RECUPERACION

VALOR POTENCIAL

INDIRECTOS

CUANTIFICABLES

\$ 24.624.652

APROBACION

VALIDADO

ACTA MESA DE TRABAJO

FECHA

APROBADO

ACTA COMITÉ TECNICO SECTORIAL

FECHA

DESCRIPCIÓN DEL HECHO O SITUACIÓN IRREGULAR DETECTADA

MEDIO DE COMUNICACIÓN

CLASE

Informe preliminar de auditoría

FECHA

20/01/2017

HECHO O SITUACION IRREGULAR

En la ejecución del contrato de obras No.LP-010-2015 del 4 de Noviembre del 2015, Las obras ejecutadas visualmente presentan en su gran mayoría una buena calidad de ejecución y de materiales, pero si existen ciertos puntos en varias placas en concreto que manifiestan fisuras y grietas como algunos bordillos también.

Estas manifestaciones tienen varias causas posibles para presentarse en una obra como esta; están desde las fallas en terrenos por mala compactación, como en materiales mal aplicados, o materiales escasos en las especificaciones exigidas, también los efectos climáticos y de medio ambiente, la aplicación errónea del concreto etc.

Debido a las características de las grietas o fisuras que se han presentado en dichas obras, presumimos que han sido producto de una mala compactación o una errónea aplicación del concreto al momento de la ejecución.

Estos hechos son imputables al contratista, interventor y supervisor del contrato, ya que se debe controlar todas estas situaciones en las obras cuando se presentan. Es posible que las manifestaciones de dichas fallas en el concreto se puedan tratar y corregir aun, atacando principalmente la causa, pero esto debe realizarlo el contratista para mantener la calidad en las obras ejecutadas.

Existen daños localizados así:

Tabla No. 13

1	Fisuras y grietas en placas (6 placas de 4.0 x3.5 mts)	Carrera 1B No. 1ª-23.	84 M2
2	Fisuras y grietas(6 placas de 4.0x3.5mts)	Carrera 1ª No 1ª-35	84 M2

Para un total de 168 M2 por arreglar, además de varios bordillos que presentan grietas por falta de junta de dilatación. Si no se presenta otra solución de arreglo del concreto dañado, se puede establecer un daño al patrimonio del estado por valor de \$ 24.624.662

ACCION CORRECTIVA

FECHA

DESCRIPCION DE LA ACCION CORRECTIVA

De acuerdo al plan de acción de reparación presentado, se realizaron intervenciones en los concretos detectados con fisuras, grietas, mapeos etc. se hicieron cortes, demoliciones, ejecuciones nuevas y reparaciones a través de productos específicos y especiales SIKA, fabricados para aplicarlos en esas situaciones y en el mejoramiento de la estructura del concreto.

Se evidencia las demoliciones de placas deterioradas, en otras se reemplazaron secciones de concreto cumpliendo con las normas para tal fin, se reemplazaron bordillos fracturados etc.
Esta intervención cumple con las características y especificaciones del concreto contratado , por lo tanto no debe presentar deficiencias futuras.

OBSERVACIONES

Las adecuaciones y mejoras se constituyen en beneficio auditor.

SOPORTES SUJETO DE CONTROL

CLASE	FECHA
Oficios de Requerimiento SPOP-2017-0009 Y 0010	03-02-2017
Informe de inspección ocular de los afectados.	08-02-2017
Informes con registro fotográfico de Ejecución de actividades de reparación de pavimento de concreto	Del 13-26-02-2017

* Convenciones: Informe de Auditoria (IA), Control de Advertencia (CA), Plan de Mejoramiento (PM), Pronunciamento (P), Indagación Preliminar (IP).

** Indirectos: en el evento de ser cuantificables

Líder auditoria: Marcos Peña

Córdoba


Auditor: Jaime Orozco Pitre.



Anexo : lo enunciado 17 folios.



MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR
Nit. 800.096.599-3
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PUBLICAS**
Código 130



La Gloria, Cesar Febrero 03 de 2017

SPOP-2017-0009

Señor:

EDUARDO PEDRAZA RINALDY

Contratista

Calle 200 N° 17-36 casa 30 portal siglo XXI

Ref: **Contrato de Obra Pública N° 010-2015**

Asunto: **REQUERIMIENTO INFORME PRELIMINAR CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CESAR**

Cordial Saludo

Me permito informarle que la contraloría Departamental del Cesar, realizo Auditoria Regular a la vigencia 2015, en la cual, con ocasión a la denuncia de la comunidad con relación al contrato cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO CLASE E (4000 PSI) PARA LA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR**, por un valor de \$672.200.107,00, iniciada el 13 de Noviembre del año 2015 y terminada el 28 de Diciembre del mismo año y ejecutada por usted; encontró que el pavimento presenta deterioro consistente en: grietas y fisuras en un 8% de la obra.


Es por esto que procedo a citarlo para que se haga presente el día miércoles 08 de Febrero de 2017 a las 9:00 am, en la secretaria de planeación Municipal, para que junto con el interventor y funcionarios de esta dependencia se proceda a hacer una evaluación y establecer con certeza los daños que presenta el concreto del pavimento para que posteriormente presenten un plan de reparación tramo a tramo ante este despacho, para su aprobación en los siguientes tres días y posterior ejecución.

Copia del presente oficio lo estoy enviando a la oficina jurídica del Municipio de la Gloria - Cesar, Control Interno, Contraloría Departamental del Cesar y a la Seguradora Seguros del Estado, en atención a la póliza N° 96-44-101117373 expedida por Seguros del Estado.



Anexo informe de la Contraloría Departamental del Cesar.

Gracias por su atención y espero pronta respuesta a lo solicitado.



ANSELMO BONFANTE AREVALO
Secretario de Planeación y Obra Públicas.
Municipio de la Gloria, Cesar

C.c. Oficina de Control Interno
C.c. Oficina Jurídica
C.c. Contraloría Departamental del Cesar

Proyecto: Luis Miguel Romero - SubSec. Planeación
Reviso: Milena Rodelo - Jefe de Jurídica.

REDACTAN

Recibidos (2.443)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (134)

► **Círculos**

Backupify Migrator 1

lacgloriaplanea@yahoo

Migrated/Important (

SRC Domain Chats

Más etiquetas ▾



Nuclear contacts

jorsenu-at-gmail.com-
-2z24rmwi
n5ec218qrqo2u0w
92j@public.talk
google.com quiere
chatear contigo.

Accepted?

si	no
----	----

• auxiliare

* controlinterno@la

◆ rentas @lagloria-c

Ellana Fiquitiva P.

LILIBETH MACH

• Sandra Milena Áv

✉ Sonia Pedraza

📁 archive archive

• **auxiliarpresuquest**

Oficio- REQUERIMIENTO INFORME PRELIMINAR CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR

secretaria de planeacion lagloria-cesar <secretariadeplaneacion@lagloria-cesar.gov.co>
para EDUARDO .

Buenas Ing. le envío oficio citando lo a una reunión el día 08 de febrero de 2017 pertinente al Contrato de Obra Publica N° 010-2015

ARQ. ANSELMO BONFANTE ARÉVALO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio de La Gloria-Cesar
Cll 2 No. 4-07 Palacio Municipal Of. Planeación
Secretariadeplaneacion@lagloria-cesar.gov.co
Tel: 321.286.1767

¿Es necesario imprimir este e-mail? ¡Salvemos al planeta!
Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.
Ahorrar papel, energía y recursos forestales, le hace bien al Medio Ambiente.

IMPORTANTE: Si usted va a reenviar este mensaje, antes de hacerlo por favor considere su obligación de borrar el nombre, dirección, cualquier otra dirección que aparezca en el mismo, así como toda información que exista de envíos anteriores.



 **secretaria de planeacion lagloria-cesar** <secretariadeplaneacion@lagloria-cesar.gov.co>
para controlinterno_oficinajudicial_nitena

----- Mensaje reenviado -----
De: **secretaría de planeación lagloria.cesar** <secretariadeplaneacion@lagloria.cesar.gov.co>
Fecha: 6 de febrero de 2017, 16:56
Asunto: Oficio-REQUERIMIENTO INFORME PRELIMINAR CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR
Para: EDUARDO PEDRAZA RINALDY <edupedraza@gmail.com>



La Gloria, Cesar Febrero 03 de 2017

SPOP-2017-0010

Señor:
ALBERTO JOSÉ FESTER ALVIS
Interventor
R/L Consorcio los Consultores

Ref: **Contrato de Obra Pública N° 010-2015**

Asunto: **REQUERIMIENTO INFORME PRELIMINAR CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CESAR**

Cordial Saludo

Me permito informarle que la contraloría Departamental del Cesar, realizo Auditoria Regular a la vigencia 2015, en la cual, con ocasión a la denuncia de la comunidad con relación al contrato cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO CLASE E (4000 PSI) PARA LA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR**, por un valor de \$672.200.107,00, iniciada el 13 de Noviembre del año 2015 y terminada el 28 de Diciembre del mismo año y ejecutada por Eduardo Pedraza Rinaldy; encontró que el pavimento presenta deterioro consistente en: grietas y fisuras en un 8% de la obra.

Es por esto que procedo a citarlo para que se haga presente el día miércoles 08 de Febrero de 2017 a las 9:00 am, en la secretaria de planeación Municipal, para que junto con el contratista y funcionarios de esta dependencia se proceda a hacer una evaluación y establecer con certeza los daños que presenta el concreto del pavimento para que posteriormente presenten un plan de reparación tramo a tramo ante este despacho, para su aprobación en los siguientes tres días y posterior ejecución.

Copia del presente oficio lo estoy enviando a la oficina jurídica del Municipio de la Gloria - Cesar, Control Interno, Contraloría Departamental del Cesar y a la Seguradora Seguros del Estado, en atención a la póliza N° 96-44-101117373 expedida por Seguros del Estado.

	MUNICIPIO DE LA GLORIA CESAR <i>Nit. 800.096.599-3</i> SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS <i>Código 130</i>	LA GLORIA  <i>Por un futuro mejor!</i>
---	---	--

Anexo informe de la Contraloría Departamental del Cesar.

Gracias por su atención y espero pronta respuesta a lo solicitado.


ANSELMO BONFANTE AREVALO
 Secretario de Planeación y Obra Públicas.
 Municipio de la Gloria, Cesar

C.c. Oficina de Control Interno
 C.c. Oficina Jurídica
 C.c. Contraloría Departamental del Cesar

Proyecto: Luis Miguel Romero - SubSec. Planeación
 Reviso: Milena Rodelo - Jefe de Jurídica.

Por un futuro mejor!

Google

in sent alberto-jm@hotmail.com

Correo

REDACTAR

Recibidos (2.441)

Destacados

Importantes

Enviados

Borradores (134)

Círculos

Backupify Migrator (

lagloriaplanea@yahoo

Migrated/Important (

SRC Domain Chats

Más etiquetas

Buscar contactos

jorsenu-at-gmail-com-
-2z24mml
n5oc218qgo2u0w
92j@public.talk
google.com quiere
chatear contigo
¿Aceptas?

si no

- auxiliarplaneacion
- controlinterno @la
- Eliana Fiquitiva P
- LILIBETH MACH
- rentas @lagloria-c
- Sandra Milena Av
- Sonia Pedraza
- archivo archivo
- auxiliarpresupuest

Oficio- REQUERIMIENTO INFORME PRELIMINAR CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL CESAR

Recibidos

1 de 2

Usuarios (5)

ALBERTO JOSE FES

Añadir a círculos

Mostrar detalles

6 feb

secretaria de planeacion lagloria-cesar <secretariadeplaneacion@lagloria-cesar.gov.co>
para alberto-jm_oficialjuridica_controlinterno_mitenia

Buenas Ing

Le envío oficio citando lo a una reunión el día 08 de febrero de 2017 referente al contrato de Obra Publica CO N°010-2015, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO CLASE E (4000 PSI) PARA LA CALZADA DE 0 17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR

Espero su asistencia

ARQ. ANSELMO BONFANTE ARÉVALO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio de La Gloria-Cesar
Cll 2 No. 4-07 Palacio Municipal Of. Planeación
Secretariadeplaneacion@lagloria-cesar.gov.co
Tel: 321 7963767

¿Es necesario imprimir este e-mail? ¡Salvemos al planeta!
Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.
Ahorrar papel, energía y recursos forestales, le hace bien al Medio Ambiente.

REMSATE SECURID: Si usted va a reenviar este mensaje, antes de hacerlo por favor considere su obligación de borrar el nombre, dirección, cualquier otra dirección que aparezca en el mismo, así como toda información que exista de envíos anteriores.



Mail Delivery Subsystem

No se ha encontrado la dirección. Tu mensaje no se ha entregado a mitenia@contra

alberto jose fester alvis

para mí

Cordial saludo

Doctor Anselmo Bonfante Arevalo.

6 feb

6 feb

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=13b8791340&view=att&th=13e12eb18ce567ac&atmid=018d5p3in0r6&relatid=f_gumcuo0&scale=1&zo remitido por su dependencia.



**INFORME DE INSPECCION OCULAR DEL CONTRATO DE OBRA N° 010-2015
EN ATENCIÓN AL REQUERIMIENTO DE LA CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CESAR.**

1. OBJETO

EVALUAR Y ESTABLECER LOS POSIBLES DAÑOS O AFECTACIONES SUFRIDAS EN LAS PLACAS DE PAVIMENTO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO CLASE E 4000 PSI PARA LA CALZADA DE 0.17 MTS EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA DEPARTAMENTO DEL CESAR" CON EL OBJETO DE DETERMINAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA SUBSANAR LAS POSIBLES DAÑOS O AFECTACIONES Y DISEÑAR UN PLAN DE REPARACIÓN DE LOS POSIBLES TRAMOS AFECTADOS ANTE LA OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE LA GLORIA CESAR.

1. LOGÍSTICA

Se reunieron el contratista titular y responsable del contrato de obra N° 010-2015 el Ingeniero EDUARDO PEDRAZA RINALDY; el representante de la interventoría el Arquitecto ALBERTO JOSÉ FESTER ALVIS y el Secretario de planeación en representación del municipio de La Gloria Cesar el Arquitecto ANSELMO BONFANTE ARÉVALO. En las instalaciones de la Alcaldía Municipal siendo las (nueve) 9:00 am, se dio inicio a la reunión y del lugar nos desplazamos hacia el corregimiento de Ayacucho, en donde se realizó el recorrido de la obra ejecutada.


1. CONCLUSIÓN


Se pudo constatar la presencia de grietas y fisuras de carácter estructurales o superficiales. Las cuales pueden ser atribuibles a diferentes causas relacionadas con los procesos constructivos recomendados para éste tipo de proyectos. Éstas fueron identificadas en diversos tramos de las vías ejecutadas para lo cual el contratista se compromete a presentar un plan de acción para la reparación o reposición de las placas y Bordillos que presentan este tipo de afecciones estructurales o fracturas que a pesar de no generar traumas mayores pueden llegar a afectar la vida útil de pavimento generando un deterioro acelerado del mismo en caso de no ser corregido a tiempo.




La secretaría de planeación en cabeza del Arquitecto ANSELMO BONFANTE ARÉVALO, otorga al contratista 3 (tres) días hábiles a partir de la fecha para la presentación de un plan con su respectivo cronograma de actividades de reparación ajustado a la norma y a los requerimientos y especificaciones técnicas de éste tipo de obra, para la aprobación por parte de la secretaría de planeación.


Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 08 de febrero de 2017 bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el.


Ing. Eduardo Pedraza Rinaldy
CONTRATISTA


Arq. Alberto José Fester Alvis
INTERVENTOR


Arq. Anselmo Bonfante Arévalo
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Por un futuro mejor!



La Gloria Cesar 10 de Febrero 2016

Señores

Ing. EDUARDO PEDRAZA RINALDY
CONTRATISTA

Arq. ALBERTO JOSE FESTER ALVIS
INTERVENTOR


Ref. Contrato de Obra N°010-2015

Respectados Señores,

Cordialmente me dirijo a ustedes con el fin de informales que de acuerdo al cronograma de ejecución de reparaciones al contrato de Obra N° 010-2015 en atención al requerimiento de la contraloría Departamental del Cesar, les informo el plan de reparaciones queda aprobado por esta oficina.

Agradezco la atención y colaboración al presente.

Cordialmente,



ARQ. ANSELMO BONFANTE AREVALO
Secretario de Planeación y Obras Públicas

		Consorcio los consultores Nit: 900908006-7		INFORME No. 1 DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE REPARACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO	
El presente Informe corresponde al periodo del 13 al 26 de febrero de 2017.					
1. DATOS GENERALES			Plazo inicial: Un mes (1) quince (15) Dias Plazo Actual: Un mes (1) quince (15) Dias		
Informacion del Contrato: C.I. No. 04 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contratista o Ejecutor: MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR			FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015		
Objeto Contractual: CONSTRUCCION 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 "CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO CLASE E (4000 PSI) PARA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR".			FECHA ACTA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2015		
Objeto Contractual: INTERVENTORIA 04 DEL 11 DE NOV. DE 2015 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO CLASE E (4000 PSI) PARA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR".			FECHA DE SUSPENSION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2015		
VALOR CONTRACTUAL: \$ 47.662.080 Valor Inicial \$ 47.662.080 Valor Final \$ 47.662.080			FECHA DE REINICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2015 NUEVA FECHA DE TERMINACION: 7 DE FEBRERO DE 2016 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EJECUTADO		

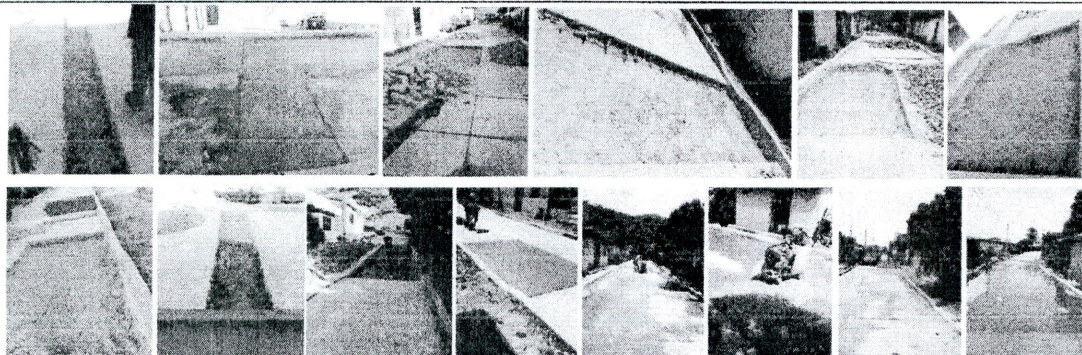
2 DATOS TECNICOS		RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL:	
META FISICA ACTUALIZADA: ☐ RED DE ACUEDUCTO ML ☐ RED ALC. SAN / PLUV ML ☐ PTAP / PTAR U ☐ POZOS PROFUNDOS M2 ☒ VIA URB / SEC / TERC KM ☐ PUENTE / ALC / BOX UN ☐ INFRAESTRUCTURA M2 ☐ INTERVENTORIA UN ☐ OTRO: CUAL?		Los recursos (Contrato de Obras e Interventoria), fueron aportados en su totalidad por el Municipio de La Gloria (Cesar). DESCRIPCION BREVE DEL ALCANCE DEL PROYECTO: Con este proyecto se busca la pavimentacion de la Carrera 2 entre calles 1 y 1B, Carrera 1C entre calles 1 y 1B, Carrera 1B entre calles 1 y 1B, la calle 1A entre carreras 1B y 1C y la Calle 2 entre Carreras 1 y 2, calles pertenecientes al Barrio 3 de octubre del corregimiento de Ayacucho, del Municipio de La Gloria - Cesar; con el fin de facilitar la movilidad de sus habitantes. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PARA LA SUBSANACION DE LAS AFECTACIONES PRESENTES: En visita de inspeccion ocular realizada en conjunto con la Secretaria de planeacion, el Contratista y la Interventoria, se corroboró la aparición de diversas fallas presentes en algunas placas, las cuales posterior al análisis realizado fueron atribuidas a diversos factores de diseño, a alveos termicos y a contracciones del concreto, las cuales quedaron registradas y para lo cual El Contratista, asumió su responsabilidad, a través del desarrollo de diversas actividades conforme a su cronograma, el cual fue planteado por El Contratista y aprobado por la Secretaria de Planeacion, con el visto bueno de la interventoria. los requerimientos tecnicos acordados y requeridos para garantizar la estabilidad de la obra y el cumplimiento del objeto contractual fueron ejecutados de conformidad con las especificaciones tecnicas planteadas y en las actividades acordadas y correspondientes a: ETAPA 2.) tambien en este mismo tramo se identificaron placas con fisuras profundas de tipo longitudinal, transversal, mapeo y con fisuras deficientes, las cuales fueron demolidas y retirados sus escombros, las paredes fueron limpiadas y retirados sus impurezas para luego ser tratadas con Sika Dur 32 primer L, producto epoxico que garantiza la adecuada adherencia entre los concretos nuevos y los existentes y facilita la reconstrucción; se utilizaron las mismas especificaciones tecnicas contempladas en el contrato, correspondientes al ítem 3.1 - Concreto clase e (4000 psi) para calzada de 0,17 mt - (No incluye: Pasadores de acero liso 1 1/4" cada .45 mt - long 0.30 mt y barras de union corrugado 1/2" cada 1.20mt - long 0.85 mt) - acelerado a 7 dias.un Concreto Impermeabilizado de 4500 PSI, se repararon en total = 68,68 M² Los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera y reconstrucción reconstrucción por visita y presado el respectivo informe de actividades a ejecutar se procedio a dar inicio a las reparaciones correspondientes en cumplimiento al cronograma respectivo, para lo cual se tomo como punta de partida la demolicion de placas identificadas con afectaciones correspondientes a fisuras longitudinales, fisuras transversales, fisuras en mapeo y grietas en bordillos.	

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES					
DESCRIPCION	NUMERO DE PLACAS REPARADAS	LOCALIZACION POR VIVIENDA CARR. 1B ENTRE CAL, CENTRAL Y CAL. 1	DIMENSIONES AREA REPARADA M		TOTAL M2 REPARADOS
1. Retiro de Escombros, limpieza y retiro de impurezas, Tratamiento con Sika Dur 32 primer L, Reconstrucción de Placas en concreto clase E 4.000 PSI para Calzadas de 0,17 mt,	2,00	No. 1A 65	7,35	2,00	14,70
		1A - 46	2,00	1,00	2,00
		1A - 35	4,00	2,00	8,00
		1A - 30	2,00	1,16	2,32
		1A - 30	3,50	2,00	7,00
		1A - 30	4,00	0,75	3,00
		1A - 15	3,50	2,00	7,00
		1A - 55	2,00	0,44	0,88
		1A - 55	3,50	2,00	7,00
		1A - 28	9,90	2,00	18,60
TOTAL M2 REPARADOS					70,50



4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRAS REGISTRADO EN DATOS GENERALES.		DATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA.	
Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRAS Contratante: MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR Contratista o Ejecutor: EDUARDO PEDRAZA RINALDY Rep. Legal: EDUARDO PEDRAZA RINALDY Contrato No: 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 Valor Inicial: \$ 672.200.107 Valor Anticipo (50%): \$ 336.100.054 Valor Adicionado: \$ Valor Total: \$ 672.200.107 Valor Ejecutado: \$ Plazo inicial: 1 MES 15 DIAS Prorroga:		Tipo de Contrato: DE INTERVENTORIA Contratante: MUNICIPIO DE LA GLORIA Contratista o Ejecutor: CONSORCIO LOS CONSULTORES Rep. Legal: ALBERTO FÉSTER ALVIS Contrato No: 04 DEL 11 DE NOV. DE 2015 Valor Inicial: \$ 47.662.080 Valor Anticipo (50%): \$ 14.298.624 Valor Adicionado: \$ Valor Total: \$ 47.662.080 Valor Ejecutado: \$ Plazo inicial: 1 MES 15 DIAS Prorroga:	

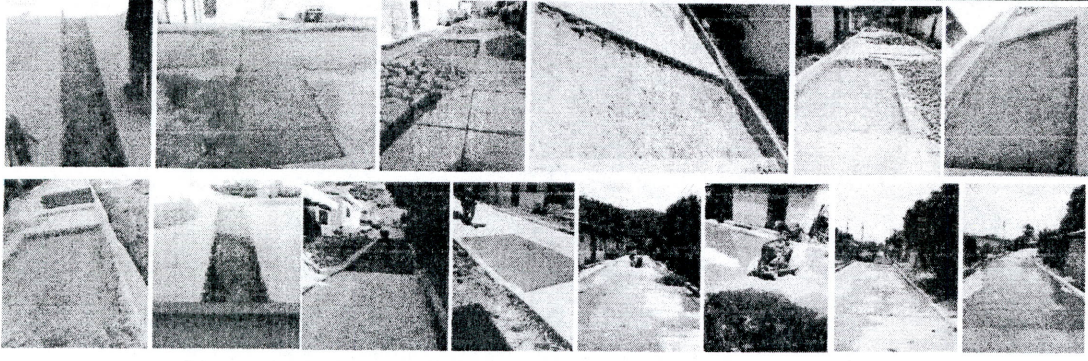






Plazo Actualizado	1 MES 15 DÍAS	Plazo Actualizado	1 MES 15 DÍAS
Suspension No. 1:	16/11/2015	Suspension No. 1:	16/11/2015
Fecha de Iniciación	13/11/2015	Fecha de Iniciación	13/11/2015
Términación Inicial:	28/12/2015	Términación Inicial:	28/12/2015
Términación Actual:	28/12/2015	Términación Actual:	28/12/2015

9. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA			
% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA	0,88%	% DE PROGRAMACION DE OBRA	0,96%
10. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO: REPARACION DE PLACAS LOCALIZADAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 1 Y CARRETERA			
Las actividades se desarrollaron entre el día 13 y el día 26 de febrero de 2017. El proceso de ejecución de las actividades programadas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones y recomendaciones presentadas en conjunto por la interventoría y la Secretaría de planeación apoyados en el manual desarrollado por Sika Colombia en el cual se exponen los tratamientos de reparación de fisuras de placas en Concreto Rígido, tal es el caso correspondientes al ítem 3.1: Concreto clase e (4000 psi) para calzada de 0,17 mt. (No incluye: Pasadores de acero liso 1			
11. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTUALIZADO (DESCRIPCION ACTIVIDADES).			
Reparación de placas en concreto de 4,000 PSI ESP = 0,17 mt			



12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☒ NO ☐ CUALES? _____ HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS SI ☒ NO ☐ CUALES? Los procesos de demolición se desarrollo teniendo en cuenta las placas afectadas por fracturas múltiples y totales que afectan su estabilidad poniendo neñen peligro la vida útil del pavimento y afectando el cumplimiento del objeto contractual para lo cual el contratista actuando de manera Negligente y responsable, asumió las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Planeación e interventoría, para la demolición y reconstrucción de las mismas ajustadas a las especificaciones contempladas en el contrato inicial y los conceptos arrojados por	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☒ NO ☐ PORQUE? La Ejecucion de las Reparaciones garantizan la estabilidad de las Obras Ejecutadas por el contratista y mejora su imagen REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____ EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN SI ☒ NO ☐ PORQUE? _____

11. OBSERVACIONES Y FIRMAS	12. FIRMAS
El 26 de Febrero de 2017 se concluyeron las obras de reparación correspondientes al proyecto de pavimentación, CONSTRATO DE OBRAS No. 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 para lo cual la interventoría adelanto el proceso de seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades desarrolladas las cuales se ejecutaron en presencia del contratista, y bajo la supervisión permanente de la Secretaría de Planeación municipal, y en atención de los requerimiento solicitados por la Secretaría de planeación Municipal	 
	REP. LEGAL INTERVENTORÍA SECRETARÍA DE PLANEACION MNICIPAL

Las actividades se desarrollaron entre el día 13 y el día 26 de febrero de 2017. El proceso de ejecución de las actividades programadas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones y recomendaciones presentadas en conjunto por la interventoría y la Secretaría de planeación apoyados en el manual desarrollado por Sika Colombia en el cual se exponen los tratamientos de reparación de fisuras de placas en Concreto Rígido, tal es el caso correspondientes al ítem 3.1: Concreto clase e (4000 psi) para calzada de 0,17 mt- (No incluye: Pasadores de acero iso 1					
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTUALIZADO (DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES) Reparación de placas en concreto de 4,000 PSI ESP = 0,17 mt					
					
12. DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO					
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☒ NO ☐ CUALES? _____ HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS SI ☒ NO ☐ CUALES? El curado de las placas presentadas en fisuras superficiales para garantizar un mejor comportamiento, conforme a las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Planeación fueron ajustadas por el contratista a los nuevos requerimientos espaciales y a los conceptos arrojados por el proceso de análisis sobre las posibles causas de las fallas presentadas.	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☒ NO ☐ PORQUE? <u>La Ejecución de las Reparaciones garantizan la estabilidad de las Obras Ejecutadas por el contratista y mejora su imagen</u> REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____ EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN SI ☒ NO ☐ PORQUE? _____				
11. OBSERVACIONES Y FIRMAS El 26 de Febrero de 2017 se concluyeron las obras de reparación correspondientes al proyecto de pavimentación, CONTRATO DE OBRAS No. 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 para lo cual la interventoría adelanto el proceso de seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades desarrolladas las cuales se ejecutaron en presencia del contratista, y bajo la supervisión permanente de la Secretaría de Planeación municipal, y en atención de los requerimientos solicitados por la Secretaría de planeación Municipal	12. FIRMAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 10px;">  </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 10px;">  </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">REP. LEGAL INTERVENTORÍA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL</td> </tr> </table>			REP. LEGAL INTERVENTORÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
					
REP. LEGAL INTERVENTORÍA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL				

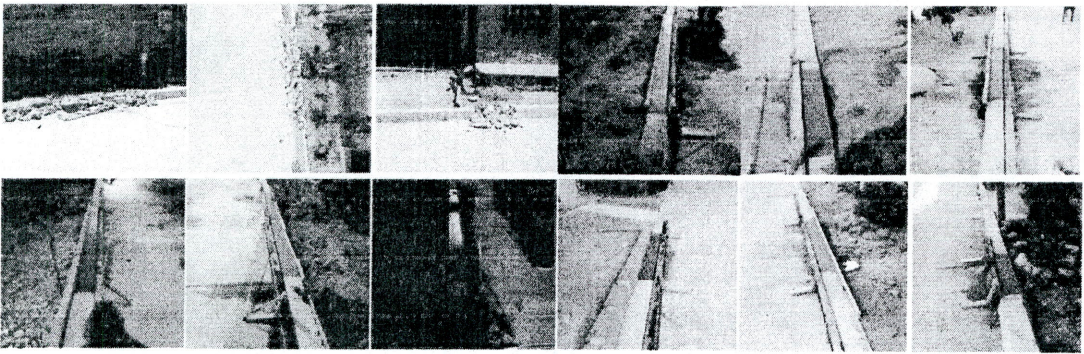

14

 Consorcio los consultores Nit: 900908006-7		INFORME No. 1 DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE REPARACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO	
El presente informe corresponde al periodo del 13 al 26 de febrero de 2017.			
1. DATOS GENERALES Información del Contrato: C.I. No. 04 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contratista o Ejecutor: MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR Objeto Contractual: CONSTRUCCION 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 "CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO CLASE E (4000 PSI) PARA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR" Objeto Contractual: INTERVENTORIA 04 DEL 11 DE NOV. DE 2015 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO CLASE E (4000 PSI) PARA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"		Plazo inicial: Un mes (1) quince (15) Dias Plazo Actual: Un mes (1) quince (15) Dias FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA ACTA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA DE SUSPENSIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DE 2015 FECHA DE REINICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2015 NUEVA FECHA DE TERMINACION: 7 DE FEBRERO DE 2016 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO EJECUTADO	
VALOR CONTRACTUAL: \$ 47.662.080 Valor Inicial \$ 47.662.080 Valor Final \$ 47.662.080			

2 DATOS TECNICOS																							
META FISICA ACTUALIZADA: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">RED DE ACUEDUCTO</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">ML</td> </tr> <tr> <td>RED ALC. SAN / PLUV</td> <td style="text-align: center;">ML</td> </tr> <tr> <td>PTAP / PTAR</td> <td style="text-align: center;">U</td> </tr> <tr> <td>POZOS PROFUNDOS</td> <td style="text-align: center;">M2</td> </tr> <tr> <td>☒ VIA URB / SEC / TERC</td> <td style="text-align: center;">KM</td> </tr> <tr> <td>PUENTE / ALC / BOX</td> <td style="text-align: center;">UN</td> </tr> <tr> <td>INFRAESTRUCTURA</td> <td style="text-align: center;">M2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td>INTERVENTORIA</td> <td style="text-align: center;">UN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRO. CUAL?</td> </tr> </table>	RED DE ACUEDUCTO	ML	RED ALC. SAN / PLUV	ML	PTAP / PTAR	U	POZOS PROFUNDOS	M2	☒ VIA URB / SEC / TERC	KM	PUENTE / ALC / BOX	UN	INFRAESTRUCTURA	M2			INTERVENTORIA	UN			OTRO. CUAL?		RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL: Los recursos (Contrato de Obras e Interventoría), fueron aportados en su totalidad por el Municipio de La Gloria (Cesar). DESCRIPCIÓN BREVE DEL ALCANCE DEL PROYECTO: Con este proyecto se busca la pavimentación de la Carrera 2 entre calles 1 y 1B, Carrera 1C entre calles 1 y 1B, Carrera 1B entre calles 1 y 1B, la calle 1A entre carreras 1B y 1C y la Calle 2 entre Carreras 1 y 2, calles pertenecientes al Barrio 3 de octubre del corregimiento de Ayacucho, del Municipio de La Gloria - Cesar ; con el fin de facilitar la movilidad de sus habitantes. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA SUBSANACION DE LAS AFECTACIONES PRESENTES: En visita de Inspección Ocular realizada en conjunto con la Secretaría de planeación, el Contratista y la Interventoria, se corroboró la aparición de diversas fallas presentes en algunas placas, las cuales posterior al análisis realizado fueron atribuibles a diversos factores de diseño, a alveos térmicos y a contracciones del concreto, las cuales quedaron registradas y para lo cual El Contratista, asumió su responsabilidad, a través del desarrollo de diversas actividades conforme a su cronograma, el cual fue planteado por El Contratista y aprobado por la Secretaría de Planeación, con el visto bueno de la interventoria, los requerimientos técnicos acordados y requeridos para garantizar la estabilidad de la obra y el cumplimiento del objeto contractual fueron ejecutados de conformidad con las especificaciones técnicas planteadas y en las actividades acordadas y correspondientes a: ETAPA 4.; también en TRAMOS 1 2, 3, 5 Y 6, se identificaron fracturas en bordillos de tipo transversal, las cuales comúnmente son generadas por fracturas existentes en las placas, estas son comunes cuando se presentan este tipo de daños en las placas de concreto las cuales se trasladan hasta los bordillos afectando su estructura, se determinó la reconstrucción de los mismos conforme a las especificaciones técnicas contempladas en el contrato, correspondientes al ítem 6.4 - Bordillos de .15x.35, concreto 3.000 psi - Incl. Excavación de .15x.15, se realizaron en total total = 20,00 ML. Los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera y supervisado por la interventoria conforme al respectivo cronograma de actividades.
RED DE ACUEDUCTO	ML																						
RED ALC. SAN / PLUV	ML																						
PTAP / PTAR	U																						
POZOS PROFUNDOS	M2																						
☒ VIA URB / SEC / TERC	KM																						
PUENTE / ALC / BOX	UN																						
INFRAESTRUCTURA	M2																						
INTERVENTORIA	UN																						
OTRO. CUAL?																							

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES						
DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PLACAS INTERVENIDAS	LOCALIZACIÓN POR VIVIENDA CARR. 2 ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 1	DIMENSIONES AREA REPARADA ML	TOTAL M2 REPARADOS		
1. La existencia de fracturas en los bordillos de tipo transversal fueron algunas generadas por las fisuras existentes en placas, estas son comunes cuando se presentan este tipo de daños en las placas de concreto las cuales se trasladan hasta los bordillos afectando su estructura, se determinó la reconstrucción de los mismos conforme a las especificaciones técnicas contempladas en el contrato, correspondientes al ítem 6.4 - Bordillos de .15x.35, concreto 3.000 psi - Incl. Excavación de .15x.15, se realizaron en total total = 20,00 ML. Los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera y supervisado por la interventoria conforme al respectivo cronograma de actividades.	2,00	No. 1A 65	2,00	2,00		
		1A - 46	1,50	1,50		
		1A - 35	3,00	3,00		
		1A - 30	1,50	1,50		
		1A - 30	4,00	4,00		
		1A - 30	1,00	1,00		
		1A - 15	2,00	2,00		
		1A - 55	0,50	0,50		
		1A - 55	2,50	2,50		
		1A - 28	2,00	2,00		
TOTAL ML DE BORDILLO LONGITUDINAL				20,00		

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRAS REGISTRADO EN DATOS GENERALES. Tipo de Contrato: CONTRATO DE OBRAS Contratante: MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR Contratista o Ejecutor: EDUARDO PEDRAZA RINALDY Rep. Legal: EDUARDO PEDRAZA RINALDY Contrato No: 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 Valor Inicial: \$ 672.200.107 Valor Anticipo (50%): \$ 336.100.054 Valor Adicionado: \$ Valor Total: \$ 672.200.107 Valor Ejecutado: \$ Plazo inicial: 1 MES 15 DÍAS Prorroga: \$ Plazo Actualizado: 1 MES 15 DÍAS Suspension No. 1: 16/11/2015 Fecha de Iniciación: 13/11/2015	DATOS CONTRATO DE INTERVENTORIA. Tipo de Contrato: DE INTERVENTORIA Contratante: MUNICIPIO DE LA GLORIA Contratista o Ejecutor: CONSORCIO LOS CONSULTORES Rep. Legal: ALBERTO FÉSTER ALVIS Contrato No: 04 DEL 11 DE NOV. DE 2015 Valor Inicial: \$ 47.662.080 Valor Anticipo (50%): \$ 14.298.624 Valor Adicionado: \$ Valor Total: \$ 47.662.080 Valor Ejecutado: \$ Plazo inicial: 1 MES 15 DÍAS Prorroga: \$ Plazo Actualizado: 1 MES 15 DÍAS Suspension No. 1: 16/11/2015 Fecha de Iniciación: 13/11/2015
---	---

Terminación Inicial: 28/12/2015 Terminación Actual: 28/12/2015	Terminación Inicial: 28/12/2015 Terminación Actual: 28/12/2015	
9. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA		
% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA 0.88%		% DE PROGRAMACION DE OBRA 0.96%
10. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO: REPARACION DE PLACAS LOCALIZADAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 1 Y CARRETERA Las actividades se desarrollaron entre el día 13 y el día 26 de febrero de 2017. El proceso de ejecución de las actividades programadas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones y recomendaciones presentadas en conjunto por la interventoría y la Secretaría de planeación apoyados en el manual desarrollado por Sika Colombia en el cual se exponen los tratamientos de reparación de Fisuras de placas en Concreto Rígido, tal es el caso correspondientes al ítem 6.4 Bordillos de .15x.35, concreto 3.000 psi - incl. Excavación de .15x.15		
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTUALIZADO (DESCRIPCION ACTIVIDADES): Reparación de placas en concreto de 4,000 PSI ESP = 0.17 mt		
		
12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE SI ☒ NO ☐ CUALES? _____ HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS SI ☒ NO ☐ CUALES? Las Dimensiones de placas fueron modificadas para garantizar un mejor comportamiento, conforme a las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Planeación fueron ajustadas por el contratista a los nuevos requerimientos espaciales y a los conceptos arrojados por el proceso de análisis sobre las posibles causas de las fallas presentadas.	SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☒ NO ☐ PORQUE? La Ejecución de las Reparaciones garantizan la estabilidad de las Obras Ejecutadas por el contratista y mejora su imagen REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____ EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN SI ☒ NO ☐ PORQUE? _____	
11. OBSERVACIONES Y FIRMAS El 26 de Febrero de 2017 se concluyeron las obras de reparación correspondientes al proyecto de pavimentación, CONTRATO DE OBRAS No. 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 para lo cual la interventoría adelanto el proceso de seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades desarrolladas las cuales se ejecutaron en presencia del contratista, y bajo la supervisión permanente de la Secretaría de Planeación municipal		12. FIRMAS   REP. LEGAL INTERVENTORÍA SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

Nit: 900908006-7

El presente Informe corresponde al periodo del 13 al 26 de febrero de 2017.

1. DATOS GENERALES		Plazo Inicial: Un mes (1) quince (15) Dias	
Información del Contrato: C.I. No. 04 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015		Plazo Actual: Un mes (1) quince (15) Dias	
Contratista o Ejecutor: MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR		FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	
Objeto Contractual: CONSTRUCCION 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015		<u>11 DE NOVIEMBRE DE 2015</u>	
"CONSTRUCCION PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO CLASE F (4000 PSI) PARA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"		FECHA ACTA DE INICIO:	
Objeto Contractual: INTERVENTORIA 04 DEL 11 DE NOV. DE 2015		<u>13 DE NOVIEMBRE DE 2015</u>	
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO CLASE F (4000 PSI) PARA CALZADA DE 0,17 MT EN DIFERENTES CALLES DEL CORREGIMIENTO DE AYACUCHO, MUNICIPIO DE LA GLORIA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
		<u>16 DE NOVIEMBRE DE 2015</u>	
		FECHA DE REINICIO:	
		<u>28 DE DICIEMBRE DE 2015</u>	
VALOR CONTRACTUAL: \$ 47.662.080		NUEVA FECHA DE TERMINACION:	
Valor Inicial \$ 47.662.080		<u>7 DE FEBRERO DE 2016</u>	
Valor Final \$ 47.662.080		ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
		EJECUTADO	

2 DATOS TECNICOS

META FISICA ACTUALIZADA:		RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL:	
	RED DE ACUEDUCTO	ML	Los recursos (Contrato de Obras e Interventoría), fueron aportados en su totalidad por el Municipio de La Gloria (Cesar).
	RED ALC. SAN / PLUV	ML	
	PTAP / PTAR	U	DESCRIPCIÓN BREVE DEL ALCANCE DEL PROYECTO:
	POZOS PROFUNDOS	ML	Con este proyecto se busca la pavimentación de la Carrera 2 entre calles 1 y 1B, Carrera 1C entre calles 1 y 1B, Carrera 1B entre calles 1 y 1B, la calle 1A entre carreras 1B y 1C y la Calle 2 entre Carreras 1 y 2, calles pertenecientes al Barrio 3 de octubre del corregimiento de Ayacucho, del Municipio de La Gloria - Cesar; con el fin de facilitar la movilidad de sus habitantes.
X	VIA URB / SEC / TERC	KM	
	PUENTE / ALC / BOX	UN	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PARA LA SUBSANACIÓN DE LAS AFECTACIONES PRESENTES:
	INFRAESTRUCTURA	M2	En visita de inspección Ocular realizada en conjunto con la Secretaría de planeación, el Contratista y la interventoría, se corroboró la aparición de diversas fallas presentes en algunas placas, las cuales posterior al análisis realizado fueron atribuibles a diversos factores de diseño, a alveos termicos y a contracciones del concreto, las cuales quedaron registradas y para lo cual El Contratista, asumió su responsabilidad, a través del desarrollo de diversas actividades conforme a su cronograma, el cual fue planteado por El Contratista y aprobado por la Secretaría de Planeación, con el visto bueno de la interventoría. los requerimientos técnicos acordados y requeridos para garantizar la estabilidad de la obra y el cumplimiento del objeto contractual fueron ejecutados de conformidad con las especificaciones técnicas planteadas y en las actividades acordadas y correspondientes a: ETAPA 3.) tambien en TRAMOS 5 y TRAMO 6 se identificaron placas con fisuras de tipo longitudinal, paralelas al eje de la calzada y algunas que se extienden desde el eje transversal hasta el borde de la losa, las cuales a pesar de ser muy típicas en pavimentos rígidos y de tratarse de grietas selladas con averturas inferiores a 0,003 mt (3 mm), se determino el cambio de tamaño mediante un nuevo modelado de las placas a través de la construcción de una junta de Dilatación Longitudinal, con sello de poliuretano elastómero de alto desempeño y cordón de espuma para fondo de junta Ø10mm. ; se utilizaron las mismas especificaciones técnicas contempladas en el contrato, correspondientes al ítem 5.1 - Junta de dilatación sello de poliuretano elastómero de alto desempeño y cordón de espuma para fondo de junta Ø10mm-Incl. Corte, se realizaron en total total = 207,53 ML Los cuales se encuentran discriminados de la siguiente manera y supervisado por la interventoría conforme al respectivo cronograma de actividades.
	INTERVENTORIA	UN	
	OTRO. CUAL?		

3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION		NUMERO DE PLACAS INTERVENIDAS	LOCALIZACION POR VIVIENDA CARR. 2 ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE. 1	DIMENSIONES AREA REAPARADA ML		TOTAL M2 REPARADOS
1	La existencia de fisuras de tipo longitudinal paralelas al eje de la calzada y algunas que se extienden desde el eje transversal hasta el borde de la loza,son muy típicas en pavimentos rígidos ademas de tratarse de grietas selladas con averturas inferiores a 0,003 mt (3 mm).	17,00	TRAMO 5	ML	103,95	103,95
		18,00	TRAMO 6	ML	103,58	103,58
	se determinlo el cambio de tamaño mediante un nuevo modelado de las placas a traves de la construccion de una junta Longitudinal, -					
	Proceso: Corte de placas, limpieza y retiro de impurezas,imprimacion de Junta de dilatación con sello de poliuretano elastómero de alto desempeño y cordón de espuma para fondo de junta ø10mm.					
			TATAL ML JUNTA LONGITUDINAL		207,53	

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRAS REGISTRADO EN DATOS GENERALES

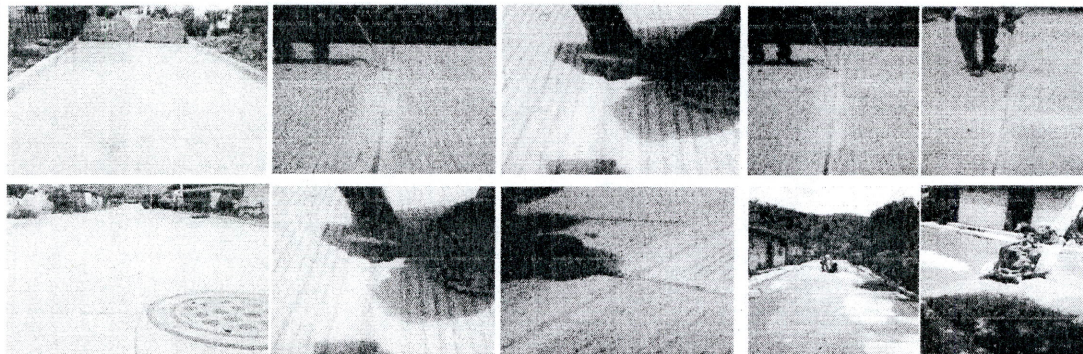
Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRAS
Contratante	MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR
Contratista o Ejecutor	EDUARDO PEDRAZA RINALDY
Rep. Legal:	EDUARDO PEDRAZA RINALDY
Contrato No	10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015
Valor Inicial:	\$ 672.200.107
Valor Anticipo (50%):	\$ 336.100.054
Valor Adicionalno:	
Valor Total:	\$ 672.200.107
Valor Ejecutado:	
Plazo inicial	1 MES 15 DÍAS
Prorroga	
Plazo Actualizado	1 MES 15 DÍAS

DATOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA


Tipo de Contrato	DE INTERVENORIA
Contratante	MUNICIPIO DE LA GLORIA
Contratista o Ejecutor	CONSORCIO LOS CONSULTORES
Rep. Legal:	ALBERTO FÉSTER ALVIS
Contrato No	04 DEL 11 DE NOV. DE 2015
Valor Inicial:	\$ 47.662.080
Valor Anticipo (50%):	\$ 14.298.624
Valor Adicionado:	
Valor Total:	\$ 47.662.080
Valor Ejecutado:	
Plazo inicial	1 MES 15 DÍAS
Prorroga	
Plazo Actualizado	1 MES 15 DÍAS

Suspension No. 1:	16/11/2015	Suspension No. 1:	16/11/2015
Fecha de Iniciación	13/11/2015	Fecha de Iniciación	13/11/2015
Términación Inicial:	28/12/2015	Términación Inicial:	28/12/2015
Términación Actual:	28/12/2015	Términación Actual:	28/12/2015

9. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA	
% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA	0,88%
% DE PROGRAMACION DE OBRA	0,96%
10. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PRESENTE PERIODO: REPARACION DE PLACAS LOCALIZADAS EN LA CALLE 1A ENTRE CARRERA 1 Y CARRETERA	
Las actividades se desarrollaron entre el día 13 y el día 26 de febrero de 2017. El proceso de ejecución de las actividades programadas fueron ejecutadas conforme a las especificaciones y recomendaciones presentadas en conjunto por la interventoría y la Secretaría de planeación apoyados en el manual desarrollado por Sika Colombia en el cual se exponen los tratamientos de reparación de fisuras de placas en Concreto Rígido, tal es el caso correspondientes al ítem 3.1: Concreto clase e (4000 psi) para calzada de 0,17 mt- (No incluye:	
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTUALIZADO (DESCRIPCION ACTIVIDADES).	
Reparación de placas en concreto de 4,000 PSI ESP = 0,17 mt	



12. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: CUMPLE	SI ☒ NO ☐
CUALES?	
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS	SI ☒ NO ☐
CUALES?	Las Dimensiones de placas fueron modificadas para garantizar un mejor comportamiento, conforme a las recomendaciones presentadas por la Secretaría de Planeación fueron ajustadas por el contratista a los nuevos requerimientos espaciales y a los conceptos arrojados por el proceso de análisis sobre las posibles causas de las fallas presentadas.
SE CUMPLE CON EL OBJETO	SI ☒ NO ☐
PORQUE?	La Ejecución de las Reparaciones garantizan la estabilidad de las Obras Ejecutadas por el contratista y mejora su imagen
REQUIERE ADICIONAL?	SI ☐ NO ☐ VALOR? _____
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN	SI ☒ NO ☐
PORQUE?	

11. OBSERVACIONES Y FIRMAS	12. FIRMAS
El 26 de Febrero de 2017 se concluyeron las obras de reparación correspondientes al proyecto de pavimentación, CONTRATO DE OBRAS No. 10 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015 para lo cual la interventoría adelanto el proceso de seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades desarrolladas las cuales se ejecutaron en presencia del contratista, y bajo la supervisión permanente de la Secretaría de Planeación municipal, y en atención de los requerimiento solicitados por la Secretaría de planeación Municipal	  REP. LEGAL INTERVENTORIA SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
